Sturm bv
aannemings- en handelsbedrijf
grond-, weg- en waterbouw

project: 14.085 - Herinrichting Kolksloot C te Oostzaan
opdrachtgever: OVER-Gemeenten, Gemeente Oostzaan
datum: 9 maart 2015

D-06-001-001 130930
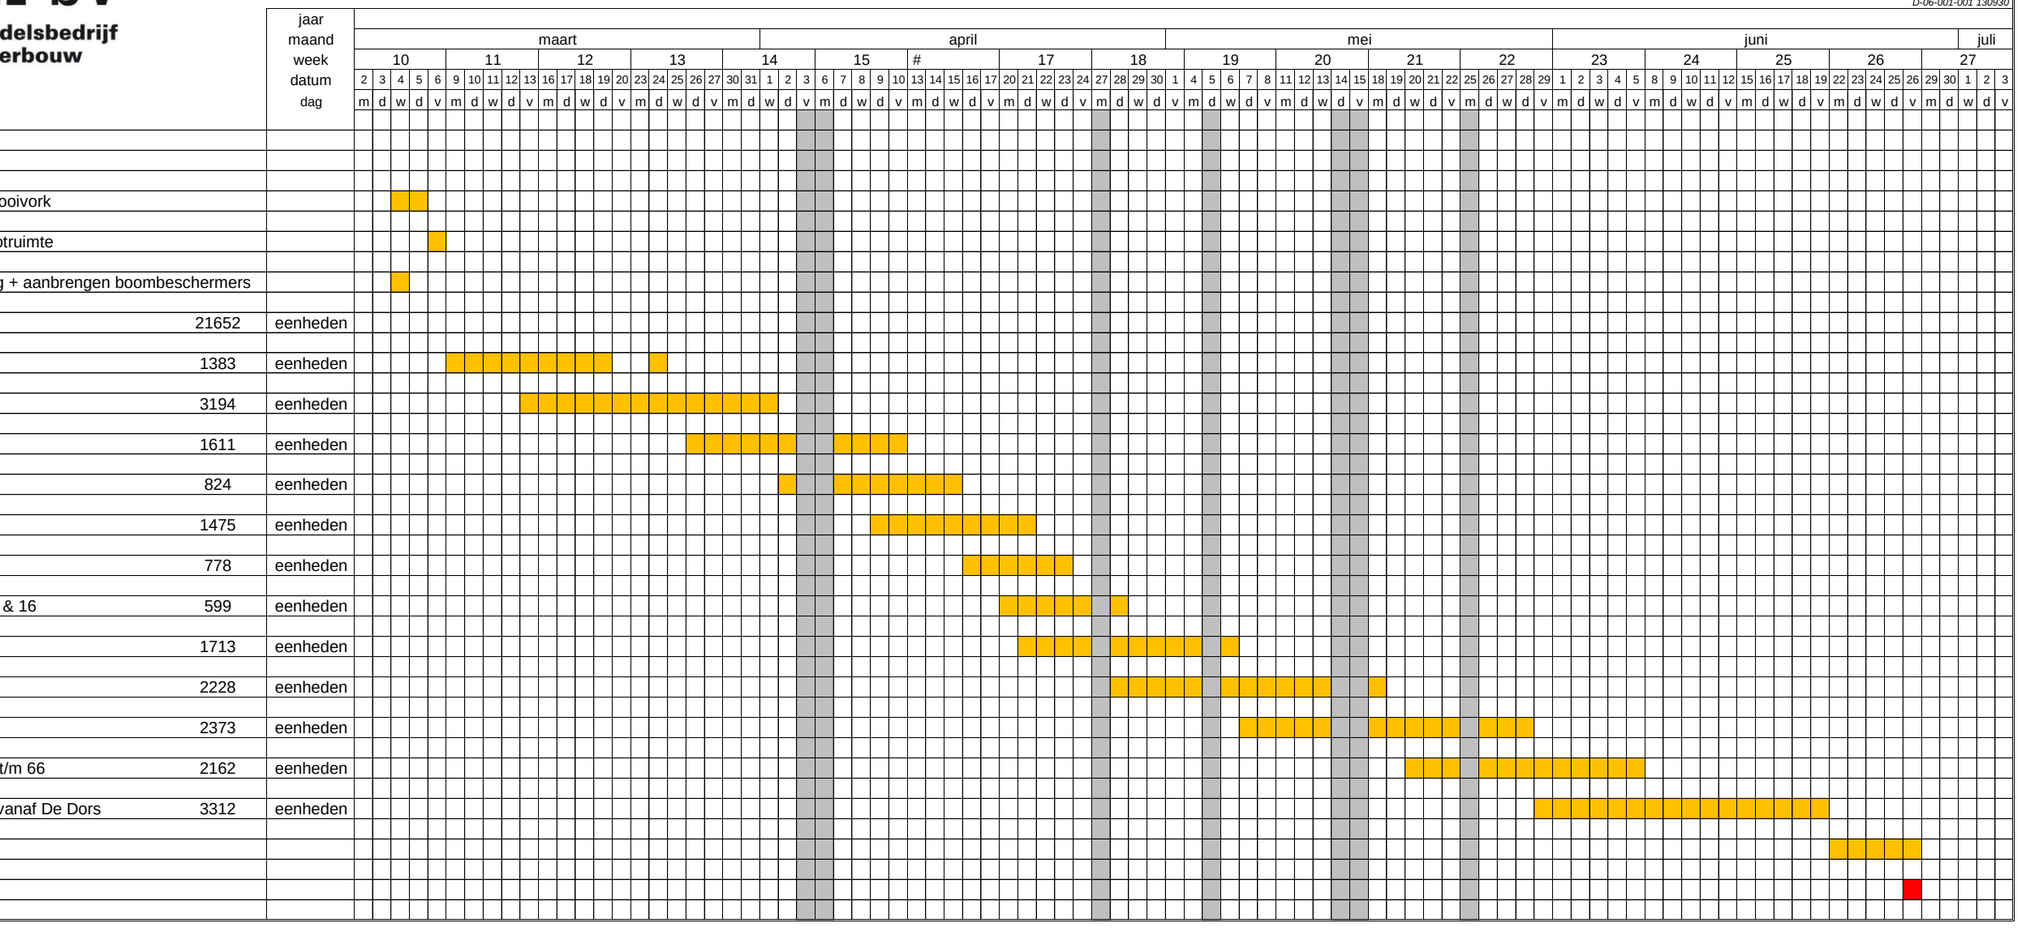
FASE 2		
Start werkzaamheden fase 1, maandag 2 maart 2015		
Reparatie riolering ter plaatse van gemaal, openbaar terrein Hooivork		
Voorbereidende werkzaamheden, proefsleuven, inrichten depotruimte		
Verwijderen en afvoeren 16 stuks bomen en 330m2 begroeiing + aanbrengen boombeschermers		
Fasering aanbrengen straatwerk	21652	eenheden
Fase 1. Hooispaad ter plaatse van woning nr. 13 t/m 36	1383	eenheden
Fase 2. Hooivork ter plaatse van woning nr. 1 t/m 45	3194	eenheden
Fase 3. Hooispaad ter plaatse van De Dors t/m woning nr. 13	1611	eenheden
Fase 4. Strekel ter plaatse van woning nr. 1 t/m 17	824	eenheden
Fase 5. Hooivork ter plaatse van woning nr. 2 t/m 18	1475	eenheden
Fase 6. Strekel ter plaatse van woning nr. 61 t/m 75	778	eenheden
Fase 7. Inrit en parkeerplaatsen Waterput achter woningen 14 & 16	599	eenheden
Fase 8. Strekel ter plaatse van woning nr. 25 t/m 55	1713	eenheden
Fase 9. Waterput ter plaatse van woning nr. 2 t/m 17 + Wel	2228	eenheden
Fase 10. Hooiijzer ter plaatse van woning nr. 1 t/m 35	2373	eenheden
Fase 11. Waterput ter plaatse van woning nr. 17 t/m 29 en 56 t/m 66	2162	eenheden
Fase 12. Hooiijzer ter plaatse van woning nr. 37 t/m 72 + Inrit vanaf De Dors	3312	eenheden
Afwerken en nalopen werkzaamheden voor oplevering		
Oplevering werkzaamheden, vrijdag 26 juni 2015
